



NIEUWSFLITS Huisvesting

Bericht 03 2021


Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

midden maart 2021

Beste mensen,


Rond de grondsteenlegging van 20 maart was het druilerig en grijs weer. De afwerking aan het dak moest onderbroken worden. Binnen werden gipsplaten tegen de wanden aangebracht, waarop later kalklagen en Keimlagen gaan komen, als onderlaag voor het uiteindelijke glaceerwerk. Zo kwam er een eerste oplichten van een lang verwachte kleur.


".... hetgeen wat zo lang in ons innerlijk leefde en leeft, treedt nu naar buiten, komt in het daglicht, ons tegemoet. Een openbreken in de nabijheid van Pasen. "




Ondertussen werd de grondsteenlegging door heel velen verder voorbereid. O.a. werd de grondsteenruimte netjes afgewerkt.

Nadat de grondsteen was gelegd werd het ventilatiekanaal van een gladde laag voorzien. Verse lucht wordt straks van buiten aangevoerd en stroomt dan van onder de communietrede de kapel binnen. In de bovenhoek bij het raam wordt de lucht afgezogen en zo continu maar onhoorbaar vervest.




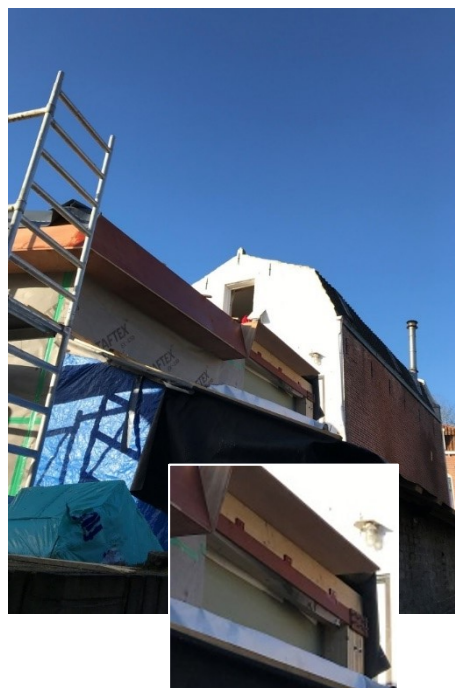

Eind februari en begin maart werd onder gunstige weersomstandigheden volop aan het dak gewerkt. Kenmerkende details werden nu zichtbaar. De vorm van de boeiboorden, het kapelraam (zie uitsnede) en de bak voor het sedumdak. Ook werd verder gewerkt aan het dakterras.

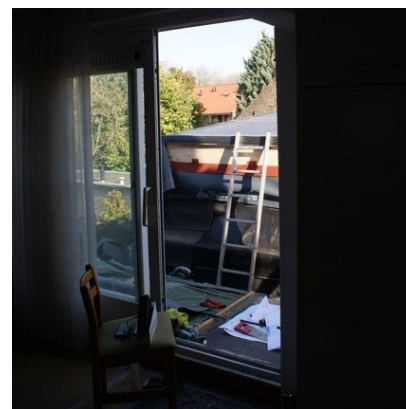


Hierlangs komt later het daglicht de ontmoetingsruimte binnen.

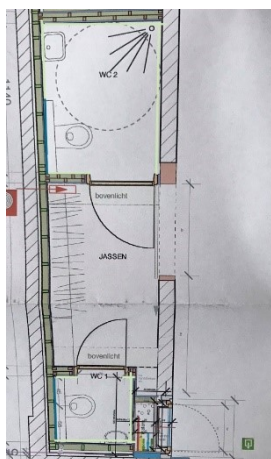


De vloer- en wandbedekking van de wc en het mindervaliden-toilet werden gekozen en besteld.

Het groen past bij de afzonder-functie en het witte sanitair zal er "pittig" op uitkomen.





De lei-tegel-pannen werden geschikt om de dak-knik te vormen.




Ondertussen werd de woning blinkend gepoetst. Deze is vanaf 1 maart verhuurd.



De pannen worden in rijen gelegd tot tegen de dikkere roeflatten, die als een ster vanuit het centrum stralen.
Tussen de pannen wordt later (surrogaat-)lood ingevlochten, dat links en rechts tegen de zijflanken van de roeflat omhoog wordt geplooid en vernageld.
Tenslotte komt later nog over de roeflat een zinken afdekprofiel van top tot goot. Die ziet er als een omgekeerd U uit. Deze dekt de roeflat en de vernageling waterdicht af.

Al het zinkwerk is natuurkleurig. Zoals al het zinkwerk in de directe omgeving, bijvoorbeeld op de abdijdaken.






Op 2 maart vloog het stof in het rond.

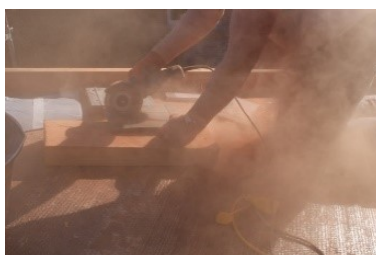



Al de pannen worden vast-
geschroefd. Een hele gerust-
stelling tijdens de storm.



Op 9 maart was het zinkwerk vol in
uitvoering! Ook werd verder
gewerkt aan de tuinmuur. De laatste
details voor het parket werden
afgesproken.

"De ploeg werkt heel nauwgezet en
kan fier zijn op hun werk; zelfs een
regenbuitje verjaagt geen glimlach!"

