



NIEUWSFLITS Huisvesting

Bericht 8 - 2021

Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

23 juni 2021

Beste mensen,

Bij het begin van de zomer is de voorruimte van een dikke laag isolatiebeton voorzien. Uiteindelijk zal alles beneden op hetzelfde niveau zijn. Behalve de sacristie die komt op de hoogte van de altaartrede.

Onze ruimte is nu letterlijk verhoogd boven straatniveau. Ook prettig bij heftige regen, omdat we op het diepste punt van de straat liggen. Voor de opstap bij de ingang vinden we zeker nog een goede oplossing.




Het isolatiebeton kwam 21 juni met enkele dagen vertraging omdat de “ondermenger”, die het cement met water en het isolatiemateriaal vermengd, kapot was.



Op en in deze ondervloer wordt binnenkort de vloerverwarming en andere techniek aangebracht. Daarna volgt vrijwel direct de “chappe” die als een afwerklaag gezien kan worden. Die laag moet egaal blijven, omdat hierop straks het linoleum verlijmd wordt.



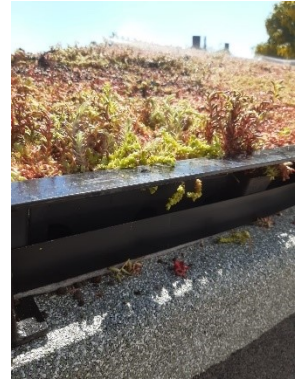


De huurders zijn blij met hun nieuwe 'tuin'.
Op 31 mei werd de sedum gelegd. De pijl
wijst naar de beregeningsinstallatie.





Er is heel wat met
zink gewerkt en
gepuzzeld om het
regenwater mooi
en goed af te
voeren.




Buitenmuren en het dak van de sacristie zijn 11 juni af. De
kozijnkleur werd uiteindelijk iets lichter gekozen.

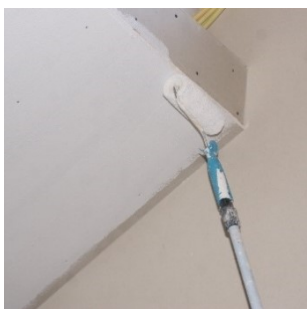

Op 1 juni werd het plafond van het achterdeel gewit en een week later was een stuc laag aangebracht. Deze bracht de subtiliteiten in vormgeving duidelijker in beeld.

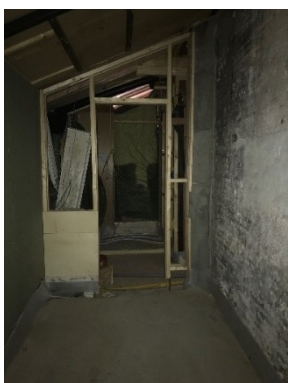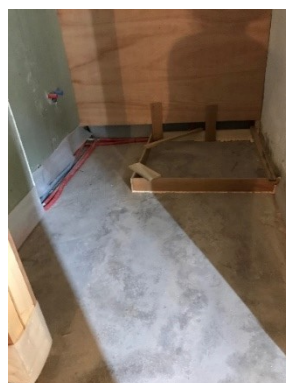

Midden juni werd de gehele voorruimte ontruimd en schoongemaakt zodat de isolerende betonlaag aangebracht kon worden. Er werden bekistingen gemaakt om ruimte voor riolering, waterleiding en nog andere technieken uit te sparen. De uitsparing achter de poort dient om later dorpel en entrepui te kunnen plaatsen. Links een doorkijkje vanuit de gesprekskamer richting sacristie.



Een Zeeuwse bijdrage voor de sacristie, een naaigarnituur voor de gewaden, met alle benodigde kleuren.

